

E3 — Lancement du projet

Support de présentation & documents associés

ShopNow Marketplace

Certification RNCP 37638 — Expert en données massives (Data Engineer)

Candidat(e) : Olive | Formation : Simplon

Projet : ShopNow Marketplace

Février 2026 — Version 1.0

Table des matières

- 1. Avant-projet — Synthèse (rappel E2)
- 2. Feuille de route (Roadmap) du projet
- 3. Calendrier de production et attribution des ressources
- 4. Méthode de suivi et outils associés
- 5. Stratégie de communication interne
- 6. Simulation — Script de l'introduction de la réunion de lancement

1. Avant-projet — Synthèse (rappel issu de E2)

Ce document prolonge directement le rapport professionnel E2. Les éléments ci-dessous sont les points clés à présenter au jury lors de la réunion de lancement.

Contexte rappelé

ShopNow transforme sa plateforme e-commerce en marketplace multi-vendeurs. Cette transformation génère un besoin urgent de centralisation et d'exploitation des données sur Azure. L'entrepôt de données (Azure Synapse Analytics) alimenté par des pipelines ETL (Azure Data Factory) est le cœur du projet.

Hypothèses techniques retenues

- **Architecture** : Medallion (Bronze / Silver / Gold) sur Azure Data Lake Storage Gen2 + Azure Synapse Analytics
- **Orchestration ETL** : Azure Data Factory
- **Visualisation** : Power BI Premium Per User
- **IAC** : Terraform pour le déploiement de l'infrastructure
- **Méthodologie** : Agile Scrum — sprints de 2 semaines

Préconisations macro

Axe	Préconisation
RGPD	Pseudonymisation dès l'ingestion en zone Bronze — registre des traitements dès J+15
Accessibilité	Rapports Power BI conformes RGAA dès la première livraison
Éco-responsabilité	Synapse Auto-Pause activé — Tier de stockage intelligent sur ADLS
Risque qualité données	Règles de validation ADF + quarantaine automatique des données incorrectes

2. Feuille de route (Roadmap) du projet

La roadmap est découpée en **4 grandes étapes** correspondant aux ensembles fonctionnels du projet.



Étape 1 — Fondations & Gouvernance (J0 → J+30)

Objectif : Mettre en place l'infrastructure Azure, documenter la gouvernance des données et démarrer la conformité RGPD.

Livrable	Responsable	Échéance
Infrastructure Azure déployée (Terraform)	Data Engineer	J+15
Registre des traitements RGPD v1	DPO + Data Engineer	J+20
Accès et habilitations configurés (RBAC Azure AD)	Data Engineer	J+20
Documentation architecture technique v1	Data Engineer	J+30
Glossaire métier v1 validé	Data Analyst + Référents métier	J+30

Risques identifiés : Délai d'approvisionnement des licences Azure — anticipé par une demande DSI dès J-15.

Étape 2 — Collecte & Ingestion (J+15 → J+60)

Objectif : Développer et déployer l'ensemble des pipelines ETL vers la zone Bronze.

Livrable	Responsable	Échéance
Pipeline SQL Server → ADLS Bronze	Data Engineer	J+30
Pipeline Azure SQL CRM → ADLS Bronze	Data Engineer	J+35
Pipeline API REST Vendeurs → ADLS Bronze	Data Engineer	J+45
Pipeline CSV/Blob → ADLS Bronze	Data Engineer	J+50

Livrable	Responsable	Échéance
Tests d'intégration pipelines	Data Engineer + Data Analyst	J+60
Monitoring ADF + alertes configurées	Data Engineer	J+55

Risques identifiés : API vendeurs sans documentation officielle — 3 jours de buffer prévu pour le reverse engineering.

Étape 3 — Modélisation & Transformation (J+45 → J+75)

Objectif : Construire le modèle dimensionnel, développer les transformations Silver et Gold, créer les premiers tableaux de bord.

Livrable	Responsable	Échéance
Modèle dimensionnel (schéma en étoile) validé	Data Analyst + Référents métier	J+50
Transformations Bronze → Silver (nettoyage, déduplication)	Data Engineer	J+60
Transformations Silver → Gold (agrégations, dimensions)	Data Engineer + Data Analyst	J+70
3 premiers tableaux de bord Power BI (ventes, vendeurs, finance)	Data Analyst	J+75
Recette fonctionnelle avec les équipes métier	Tous	J+75

Risques identifiés : Désaccord sur la définition des KPI — atelier de co-définition prévu dès J+45 avec Finance et Commerce.

Étape 4 — Mise en production (J+75 → J+90)

Objectif : Déployer en production, former les utilisateurs, livrer la documentation finale.

Livrable	Responsable	Échéance
Déploiement production (Terraform apply)	Data Engineer	J+80
2 tableaux de bord supplémentaires (logistique, conformité)	Data Analyst	J+82
Documentation utilisateur Power BI (accessible RGAA)	Data Analyst	J+85
Sessions de formation utilisateurs (4 équipes × 2h)	Data Analyst + Chef de projet	J+85 à J+88

Livrable	Responsable	Échéance
Bilan de projet + REX documenté	Chef de projet	J+90


3. Calendrier de production et attribution des ressources

3.1 Équipe projet et compétences

Membre	Rôle	Compétences clés	Taux d'affectation
Olive	Data Engineer (lead)	Azure (ADF, Synapse, ADLS), Terraform, Python, SQL	100%
[Prénom]	Data Analyst	Power BI DAX, modélisation dimensionnelle, SQL	80%
[Prénom]	DPO	RGPD, registre des traitements, droit numérique	20%
[Prénom]	Chef de projet DSI	Pilotage Agile, coordination métier, budget	50%
Référents métier (×3)	Finance / Commerce / Logistique	Validation fonctionnelle, recette	10% chacun

Note accessibilité : les postes de travail de l'équipe technique sont équipés de doubles écrans et configurés pour le développement distant sur Azure. Aucun aménagement spécifique de poste n'a été identifié comme nécessaire à ce stade — à réévaluer si un nouveau membre rejoint l'équipe.

3.2 Planning détaillé — Diagramme de Gantt (synthèse)

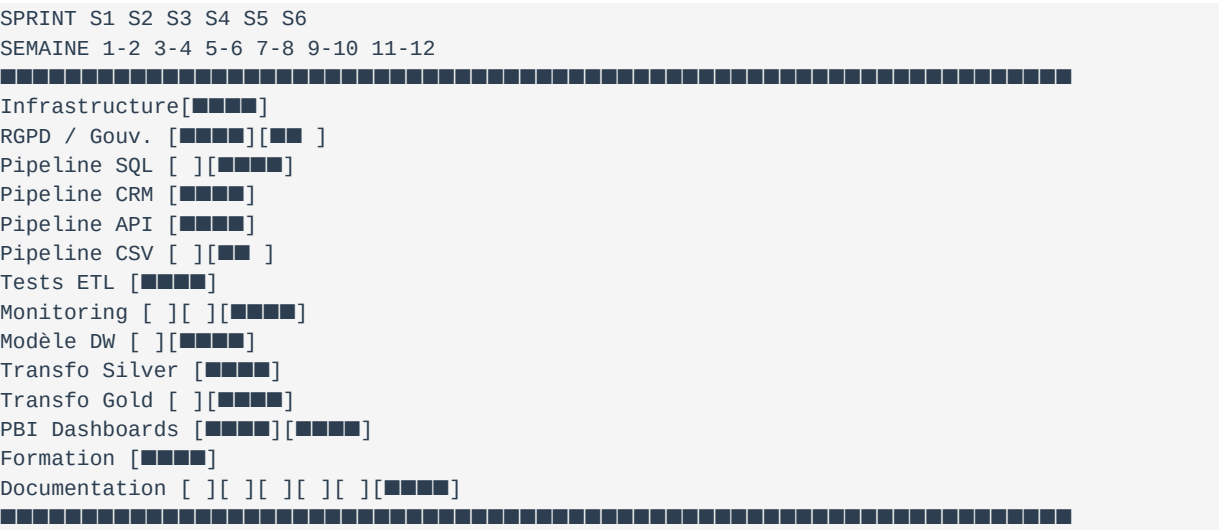

3.3 Pondération des efforts — Méthode de l'unité équivalente

La pondération des tâches a été réalisée collectivement lors du sprint 0 selon la **méthode de l'unité équivalente** (1 UE = 1 jour/homme de référence) :

Tâche	UE estimées	Ressource
Déploiement infrastructure Terraform	5 UE	Data Engineer
Pipeline SQL Server (ingestion)	4 UE	Data Engineer
Pipeline API REST Vendeurs	6 UE	Data Engineer (complexité API)
Modèle dimensionnel	5 UE	Data Analyst
Transformations Silver/Gold	8 UE	Data Engineer + Data Analyst
Tableaux de bord Power BI (5)	10 UE	Data Analyst
Documentation + formation	4 UE	Data Analyst + Chef de projet
Conformité RGPD	3 UE	DPO + Data Engineer
TOTAL	45 UE	

Les éléments de planification ont été partagés avec l'équipe via Azure DevOps (accessible, compatibilité lecteur d'écran NVDA validée) et sous forme de document PDF balisé conforme RGAA, conformément aux recommandations de l'association Valentin Haüy.

4. Méthode de suivi et outils associés

4.1 Outils de suivi

Outil	Usage	Accès
Azure DevOps	Backlog Scrum, Kanban board, Burndown chart	Toute l'équipe — authentification Azure AD
Azure Monitor	Supervision des pipelines ETL, alertes en cas d'erreur	Data Engineer (alertes email pour tous)
Confluence	Documentation projet, comptes-rendus, REX	Toute l'équipe + parties prenantes métier
Teams	Communication quotidienne, daily's asynchrones	Toute l'équipe
Power BI Service	Suivi des indicateurs projet (vélocité, bugs)	Chef de projet + Management

4.2 Rituels Agile Scrum

Rituel	Fréquence	Durée	Participants	Format
Daily standup	Chaque jour ouvré	15 min	Équipe technique	Présentiel ou Teams
Sprint planning	Début de chaque sprint (J0, J+14, J+28...)	2h	Équipe + Chef de projet	Présentiel
Sprint review	Fin de chaque sprint	1h	Équipe + Référénts métier	Présentiel — démo en direct
Rétrospective	Fin de chaque sprint	45 min	Équipe technique	Présentiel
Comité de pilotage	Mensuel	1h	Chef de projet + Direction + DPO	Présentiel

Règles de participation :

- Le daily standup est asynchrone en cas d'impossibilité (message Teams structuré : fait hier / prévu aujourd'hui / blocages)
- Les comptes-rendus de sprint review sont rédigés dans Confluence dans les 24h et partagés à toutes les parties prenantes
- Toute décision d'arbitrage est documentée dans la section "Décisions" du Confluence du projet

4.3 Indicateurs de suivi

Indicateur	Cible	Outil de mesure	Fréquence
Vélocité sprint	≥ 7 UE / sprint	Azure DevOps Burndown	Par sprint
Taux de completion du backlog	100% des user stories priorité 1	Azure DevOps Board	Par sprint
Taux de succès pipelines ETL	$\geq 98\%$	Azure Monitor	Quotidien
Taux de fraîcheur des données	Données disponibles en ≤ 1 h	Azure Monitor	Continu
Couverture RGPD	100% des traitements documentés	Registre DPO	Mensuel
Budget consommé	$\leq 100\%$ du budget prévu	Azure Cost Management	Hebdomadaire

5. Stratégie de communication interne

5.1 Plan de communication — Vue d'ensemble

Étape	Type de communication	Public cible	Format	Responsable	Échéance
Lancement	Réunion de kick-off	Toute l'équipe + Direction	Présentiel — slides	Chef de projet	J0
Fin sprint 1	Note d'avancement	Direction + DSI	Email + document Confluence	Chef de projet	J+14
Fin sprint 2	Démo intermédiaire (pipelines)	Référents métier + DSI	Teams — démo live	Data Engineer	J+28
Jalon Bronze	Rapport d'étape v1	Direction + DPO	Document PDF accessible	Chef de projet	J+30
Fin sprint 3	Note d'avancement	Direction + DSI	Email + Confluence	Chef de projet	J+42
Fin sprint 4	Démo modèle de données	Référents métier	Présentiel — démo Synapse	Data Analyst	J+56
Jalon Silver	Rapport d'étape v2	Direction + DPO	Document PDF accessible	Chef de projet	J+60
Recette fonctionnelle	Ateliers de validation	Équipes métier (x4)	Présentiel — 2h par équipe	Data Analyst	J+75
Livraison finale	Présentation de lancement production	Direction + toutes équipes	Présentiel — slides + démo	Chef de projet + Data Analyst	J+90
Post-lancement	Enquête de satisfaction	Toutes équipes utilisatrices	Formulaire Teams	Chef de projet	J+97

5.2 Orientations et arbitrages communiqués

Chaque communication présentera explicitement :

- Les **choix techniques retenus** et leur justification (ex : pourquoi Synapse plutôt que Databricks, pourquoi batch plutôt que streaming)
- Les **arbitrages menés** face aux contraintes (ex : priorisation des tables sources, report de la fonctionnalité logs temps réel en phase 2)
- Les **impacts pour les équipes** concernées (ex : changement de processus, nouvelles interfaces à utiliser)

5.3 Documentation utilisateur et accompagnement

Action	Responsable	Échéance	Format
Guide utilisateur Power BI (5 tableaux de bord)	Data Analyst	J+85	PDF balisé accessible (RGAA) — police ≥ 12pt, contraste 4,5:1

Action	Responsable	Échéance	Format
FAQ technique (pipelines, accès, droits)	Data Engineer	J+85	Confluence — navigation par ancrés
Sessions de formation (4 équipes × 2h)	Data Analyst + Chef de projet	J+85→J+88	Présentiel — supports projetés + PDF distribué
Vidéo de prise en main Power BI (5 min)	Data Analyst	J+88	Sous-titrée — hébergée sur Teams

Les sessions de formation sont adaptées aux besoins de chaque équipe (Finance ≠ Logistique ≠ Marketing). Les participants sont ceux dont les missions sont directement concernées par la prise en main des tableaux de bord livrés.

5.4 Recueil des retours et traitement

Le recueil des retours des parties prenantes suit un processus intégré à la stratégie de communication :

1. **Sprint review** : retours fonctionnels collectés en direct — consignés dans Confluence dans les 24h
2. **Formulaire de satisfaction** post-lancement (J+97) : dépouillement en J+100 — synthèse partagée à la Direction
3. **Canal Teams dédié** (#shopnow-data-feedback) : ouvert dès J0 — traité hebdomadairement par le chef de projet
4. **Ticket Azure DevOps** : tout retour de bug ou d'amélioration est tracé, priorisé et assigné dans le backlog

6. Simulation — Script de l'introduction de la réunion de lancement

Ce script correspond à la présentation orale de 10 minutes simulée devant le jury (E3). Il suit la structure : accueil → contexte → équipe → roadmap → méthode de travail → communication → call to action.

[SLIDE 1 — Titre]

"ShopNow Data Warehouse — Réunion de lancement"

Data Engineer lead : Olive — [Date]

[SLIDE 2 — Accueil et ordre du jour]

Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi(e) de vous accueillir pour le lancement officiel du projet data ShopNow. Cette réunion a pour objectif de nous aligner collectivement sur les objectifs du projet, l'organisation que nous allons mettre en place, et le rôle de chacun dans sa réussite.

Ordre du jour (10 min) :

1. Rappel du contexte et des enjeux — 2 min
2. Présentation de l'équipe et des rôles — 1 min
3. Feuille de route et jalons clés — 3 min
4. Comment nous allons travailler ensemble — 2 min
5. Questions et prochaines étapes — 2 min

[SLIDE 3 — Pourquoi ce projet, pourquoi maintenant ?]

ShopNow est en train de vivre une transformation majeure. Nous passons d'un e-commerce classique à une marketplace multi-vendeurs. Cette transformation, c'est une formidable opportunité commerciale — mais elle multiplie également par 5 le volume de données que nous allons gérer.

>

Aujourd'hui, ces données sont fragmentées : les ventes sont dans SQL Server, les clients dans le CRM, les catalogues vendeurs dans des API partenaires, les logs dans Azure Blob. Personne n'a une vision consolidée. C'est ce problème que ce projet va résoudre.

>

Dans 90 jours, nous aurons un entrepôt de données centralisé sur Azure Synapse, 5 tableaux de bord Power BI opérationnels, et une infrastructure conforme au RGPD. Ce n'est pas un projet "data pour la data" — c'est un projet stratégique pour que ShopNow puisse piloter sa croissance.

Objectif résumé en une phrase :

"Centraliser, fiabiliser et rendre exploitables toutes les données de la marketplace, pour que chaque équipe puisse prendre de meilleures décisions, plus vite."

[SLIDE 4 — L'équipe projet]

Voici l'équipe qui va porter ce projet. Nous sommes intentionnellement une équipe resserrée pour rester agiles.

Rôle	Nom	Mission principale
Data Engineer lead	Olive	Architecture, ETL, infrastructure
Data Analyst	[Prénom]	Modèle de données, Power BI
DPO	[Prénom]	Conformité RGPD
Chef de projet	[Prénom]	Pilotage, coordination, budget
Référents métier	Finance, Commerce, Logistique	Validation fonctionnelle

Je veux insister sur le rôle des référents métier. Vous n'êtes pas là juste pour valider en fin de parcours. Vous êtes des membres actifs de ce projet — vos retours à chaque sprint review seront déterminants pour que ce qu'on livre corresponde vraiment à vos besoins.

[SLIDE 5 — Feuille de route]

Voici comment nous allons progresser sur les 3 prochains mois.

4 grandes étapes :

Étape	Période	Ce qu'on livre
■ ■ Fondations & Gouvernance	J0 → J+30	Infrastructure Azure, accès, registre RGPD
■ Collecte & Ingestion	J+15 → J+60	Tous les pipelines ETL opérationnels
■ Modélisation & Transformation	J+45 → J+75	Modèle dimensionnel + 3 premiers dashboards
■ Mise en production	J+75 → J+90	Déploiement + formation + documentation

Vous noterez que les étapes se chevauchent volontairement — pendant qu'on finalise les pipelines, on commence déjà à modéliser. Ça nous permet de livrer de la valeur progressivement plutôt que d'attendre la fin.

Premier jalon visible pour vous : J+28 — démo des premiers pipelines en fonctionnement.

[SLIDE 6 — Comment nous allons travailler ensemble]

Nous travaillons en Agile Scrum, par sprints de 2 semaines. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous ?

Ce que ça implique pour l'équipe technique :

- Un daily standup de 15 min chaque matin
- Un sprint planning tous les 14 jours pour prioriser
- Une sprint review en fin de sprint — avec une démonstration en live

Ce que ça implique pour vous, les référents métier :

- Environ 2h tous les 14 jours pour assister aux sprint reviews et valider les livrables
- La possibilité de faire remonter vos retours à tout moment via le canal Teams dédié

Tout est suivi dans Azure DevOps — backlog, avancement, bugs. Vous y aurez accès en lecture si vous souhaitez suivre l'avancement en temps réel.

Notre outil de communication central : le canal Teams #shopnow-data

Toute décision importante, tout arbitrage, toute alerte y sera communiqué. Si vous recevez une information importante par un autre canal, merci de la relayer là pour que toute l'équipe soit alignée.

[SLIDE 7 — Ce que nous attendons de vous]

Pour que ce projet réussisse, nous avons besoin de trois choses de votre part.

- 1. **Votre disponibilité aux sprint reviews** — 2h tous les 14 jours. C'est le moment où votre feedback a le plus de valeur.
- 2. **Votre réactivité sur les questions de définition** — Quand on vous demande "comment calculez-vous votre taux de marge ?", répondre en 48h nous évite parfois plusieurs jours de retard.
- 3. **Votre remontée proactive des problèmes** — Si vous voyez que quelque chose ne va pas dans un tableau de bord, dites-le immédiatement via Teams. Plus tôt on sait, plus facile c'est à corriger.

[SLIDE 8 — Prochaines étapes]

Pour clôturer cette réunion de lancement, voici les actions immédiates.

Action	Responsable	Échéance
Validation des accès Azure DevOps	Chef de projet	Aujourd'hui
Invitation sprint review #1	Chef de projet	Aujourd'hui
Confirmation des référents métier officiels	Chaque direction	J+3
Kick-off technique (équipe data)	Data Engineer	Demain matin
Premier daily standup	Toute l'équipe	Demain 9h30

Une question avant de terminer : y a-t-il des contraintes calendaires importantes dans vos équipes sur les 3 prochains mois dont je devrais tenir compte — clôtures, congés, audits — que nous n'aurions pas encore identifiées ?

Merci à tous. Nous avons 90 jours devant nous, une équipe solide, et un projet qui a du sens. Lançons-nous !

Document rédigé dans le cadre de la certification RNCP 37638 — Expert en données massives (Data Engineer) — Simplon
Version 1.0 — Février 2026

Annexe — Checklist conformité accessibilité (livrables E3)

Conformément aux recommandations de l'association Valentin Haüy et du RGAA v4 :

Critère	Statut
Contraste texte $\geq 4,5:1$ sur tous les supports de présentation	■
Titres structurés (H1/H2/H3) dans tous les documents	■
Tableaux avec en-têtes de colonnes balisées	■
L'information n'est jamais transmise par la couleur seule	■
Documents PDF exportés avec balises de structure	■
Vidéo de formation sous-titrée	■ (prévu J+88)
Navigation clavier opérationnelle sur Power BI Service	■
Police $\geq 12\text{pt}$ sur tous les documents imprimables	■
